

Схема производства работ при разборке существующих зданий и сетей

Условные обозначения сетей

Наименование	Проектируемые	Существующие	Ранее проектируемые	Демонтируемые	Примечание
Водопровод		— В —	— X —	X X	Протяженность дем. сети - 460 м
Канализация бытовая		— КБ —	— X —	X X	Протяженность дем. сети - 461 м
Дренажный трубопровод		— Др —	— X —	X X	Протяженность дем. сети - 540 м
Теплоснабжение		— Т —	— X —	X X	Протяженность дем. сети - 574 м
Газоснабжение		— Г —	— X —	X X	Протяженность дем. сети - 532 м
Кабель электроснабжения		— — —	— X —	X X	Протяженность дем. сети - 87 м
Кабель электросветления		— — —	— X —	X X	



Условные обозначения

- существующие здания
- демонируемые здания
- инвентарные здания
- 1 — пост охраны
- 2 — биотуалет
- 3 — контейнеры для сбора мусора
- 4 — пожарный щит
- площадки складирования
- границы участка
- временное ограждение с защитным козырьком
- временное ограждение без защитного козырька
- опасная зона (зона возможного обрушения разбираемого здания)
- стоянка экскаватора и границы работы экскаватора
- направление движения экскаватора

Схема ограждения без защитного козырька





Схема ограждения с защитным козырьком

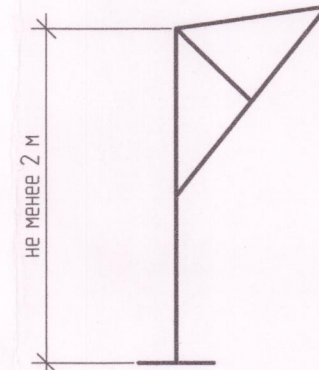

- Примечания:
- Объем существующих строений - 17224,6 м³.
 - общая протяженность забора - 727 м, в т.ч. с защитным ограждением - 305 м, без защитного ограждения - 422 м.

Составлено: _____, Проверено: _____, Дата: _____, Лист: _____, Всего листов: _____

1060-ПОД				
Жилой комплекс по ул. Ухтомского				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработчик	Кузнецов			
Проектировщик	Шульженко			
Начальник	Тихонова			
Инженер	Белановской			
Схема производства работ при разборе существующих зданий и сетей			ПРОМСТРОИЭКСПЕРТИЗА проектный институт	
Формат			А1	
